# Planning and Progress Report

## **Estudiante 4:**

-DNI: 29545609Q

-UVUS: Felpennun

-Nombre: Peña Núñez,

**Felipe** 

-Roles: Developer, Tester,

**Analyst** 

#### 13-03-2025

**Grupo: C1.030 Repositorio:** 

https://github.com/JuanAntonioMorenoMog

uel/ACME-ANS-D01





# **Tabla de Contenidos**

Resumen Ejecutivo	3
Historial de Versiones	4
Introducción	5
Contenido	6
Conclusiones	8
Bibliografía	9

## Resumen Ejecutivo

En esta entrega todos los miembros del equipo han trabajado de manera correcta y Felipe ha consumido casi 222 del total de todos los miembros del equipo. Las estimaciones esta vez han sido más precisas, se ha estimado teniendo en cuenta que eran tareas con conceptos similares entre ellas.

# **Historial de Versiones**

Versión	Fecha	Fecha Descripción de los cambios			
V1.0	13/03/2025	Creación del informe			

## Introducción

En este informe se recoge el seguimiento de tiempo correspondiente al trabajo individual del estudiante #4 (Peña Nuñez, Felipe) durante el segundo entregable, se analizó tanto la planificación como el progreso de las tareas. El seguimiento se ha realizado mediante el uso de Github Dashboard y Excel, donde se especifica las tareas a realizar por los miembros, el carácter de dichas tareas y el precio. Por último, se muestra una comparación entre las horas y precio estimados y los reales. Se incluye además en la entega un informe con las horas trabajadas detalladamente extraído de Clockify.

## Contenido

## Planning:

									Tipo	Pricing/hora
Numero tarea	Tipo	Responsable	Horas Estimada	Pricing Estimado	Horas	Pricing	Descripcion		Documentacio	on 2
14-03	Codigo	Felpennun	1:30 horas	30	1 hora	20	AssistanceAge	nt	Codigo	2
I4-04	Codigo	Felpennun	1 hora	20	30 min	10	Claim		Testing	
14-05	Codigo	Felpennun	1 hora	20	1:08 horas	23	TrackingLog		Operacional	2
14-06	Testing	Felpennun	1 hora	20	20 min	7	Sample Data		Analisis	3
									Manager	3
14-15	Codigo	Felpennun	30 minutos	10	20 min	7	Dashboard			
I4-16	Documentacion	Felpennun	50 min	17	1:10 horas	23	UML model			
14-27	Analisis	Felpennun	45 minutos	22.5	40 minutos	20	Analisis report			
14-28	Documentacion	Felpennun	45 minutos	15	1 hora	20	Planning Report			
G-07	Codigo	Felpennun	1:30 horas	30	3 horas	60	Service			
G-09	Testing	Felpennun	30 minutos	10	1:30 horas	30	Sample Data			

Tarea 14-03: Create role AssistanceAgent

Tarea 14-04: Create entity Claim

Tarea 14-05: Create entity TrackingLog

Tarea 14-06: Produce AssitanceAgents sample data

Tarea I4-15: Create AssistanceAgents Dashboard

Tarea I4-16: UML model for student 4


<u>Tarea 14-27:</u> Produce an analysis report.


Tarea 14-28: Produce a planning and progress report.

Tarea G-07: Create entity Service

Tarea G-09: Produce sample data

El precio total es de 220 euros por la realización de todas las tareas asignadas, mientras que se habían estimado un 194.5 por la realización de estas.



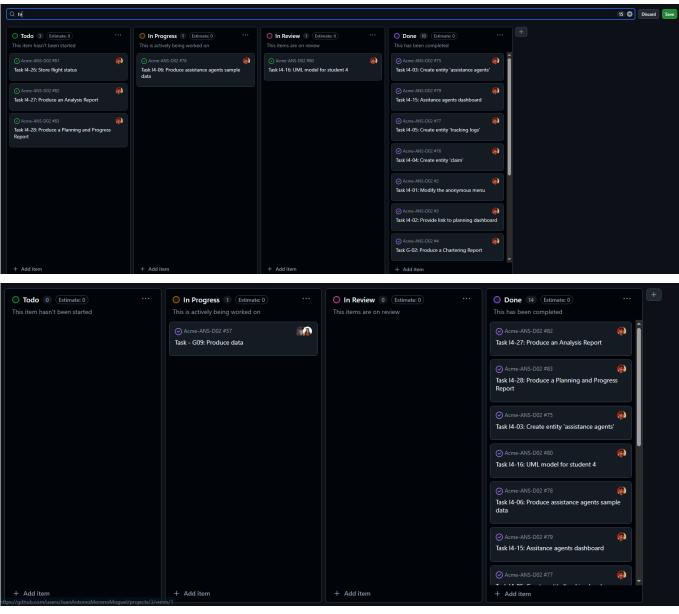

### **Progress:**

Considero que se ha trabajado de forma correcta en esta entrega ya que se han realizado las tareas bien y con tiempo, exceptuando la tarea I4-26 que se ha decido no hacer. Debido a que Felipe curso la asignatura el año pasado ha podido desenvolverse con más facilidad a la hora de realizar las tareas de creación de entidades por tener conocimientos previos. Hay que mencionar que se ha tenido en cuenta el tiempo empleado en la corrección de tareas de forma general y se ha repartido equitativamente en las tareas implicadas.

#### Conflictos que han surgido:

Algún atributo ha sido más complejo de lo esperado y se ha tenido que acudir al foro en busca de soluciones, donde ya se habían publicado preguntas sobre la misma duda.

#### Comparación coste estimado/real:

Las horas y el coste estimado no difieren mucho de los valores reales ya que se ha tenido en cuenta que eran tareas similares y se ha estimado en base a eso, también se ha tenido en cuenta la experiencia previa de la asignatura, aun así, se observa que por norma general se ha tardado menos de lo esperado en la realización de las tareas, exceptuando las tareas grupales, que fueron las primeras en hacerse y en las que más dudas surgieron, de ahí la gran diferencia de tiempo comparado con el resto.

## **Conclusiones**

Como era de esperar la carga de trabajo ha aumentado ligeramente pero la complejidad no ha cambiado mucho, los tiempos no han sido muy extensos ya eran tareas que repetían conceptos. Los conflictos han sido fáciles de resolver y para próximas entregas se estima que el coste será muy diferente pues se entrará en tareas más numerosas y complejas, y por tanto, también se estima que se necesitará más tiempo.

# Bibliografía

Foro de asignatura en evaluación virtual:

https://ev.us.es/ultra/courses/\_85092\_1/cl/outline
